



PROJECTEVALUATIE AWP 2.0

COMMISSIE WATERKETEN, 30 SEPTEMBER 2026

Aanleiding


Verouderde onderdelen
Oplopende onderhoudskosten
Storingsgevoelig, beschikbaarheid onvoldoende
Beperkte inspectiemogelijkheden

Opgave

30 jaar bedrijfszeker
Continu afvalwatertransport tijdens ombouw

Gerealiseerd

Renovatie persstations
Leidingverdubbeling Bergen op Zoom–Bath
Nieuwe procesautomatisering en monitoring
Optimalisaties in het systeem

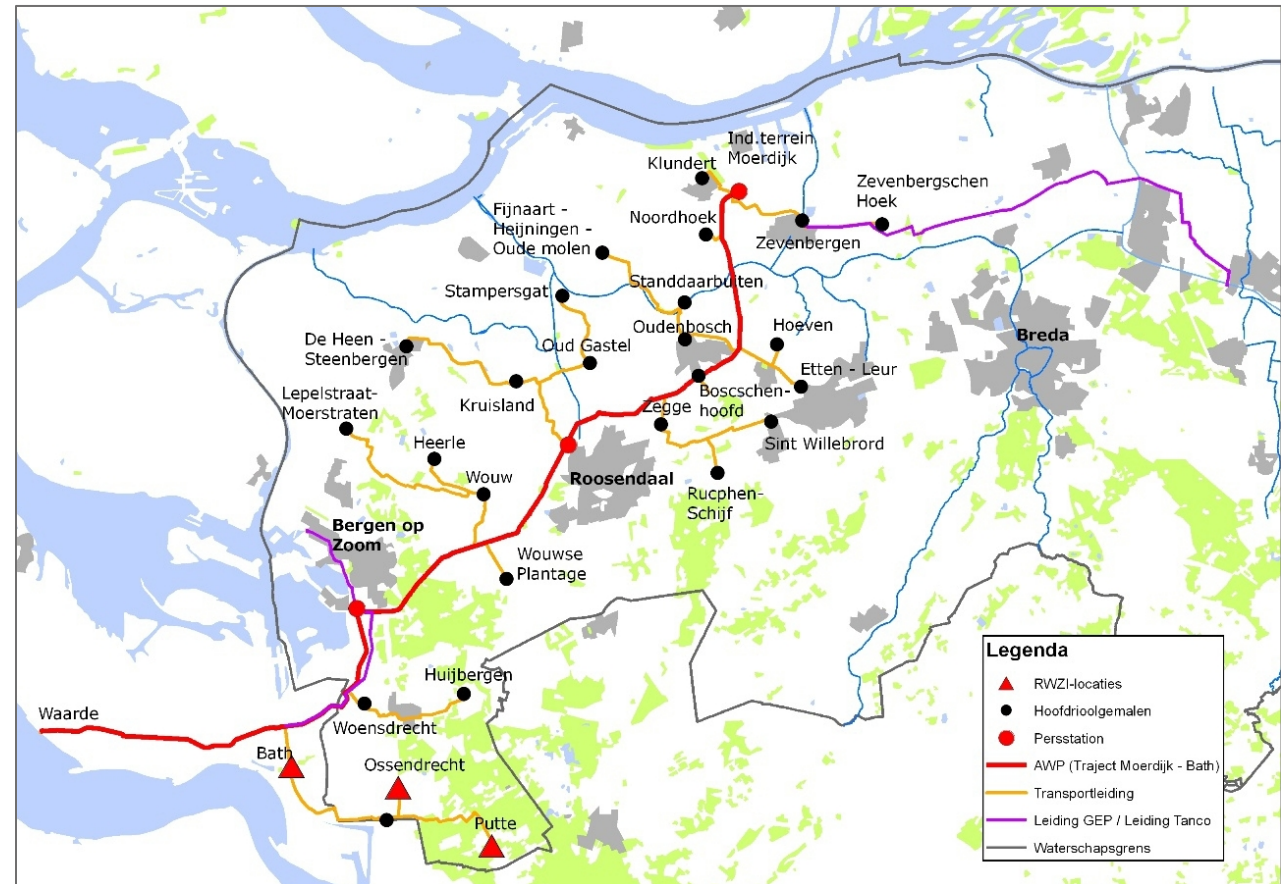

AWP 2.0: KWALITATIEF RESULTAAT

100%

Functionaliteit

100%

Veiligheid

100%

Toekomstbestendig

100%

Duurzaamheid

98%

Beheerbaar


100%*

Imago

* met bijgestelde ambitie


Hoofddoelstelling behaald

AWP opnieuw bedrijfszeker voor de lange termijn

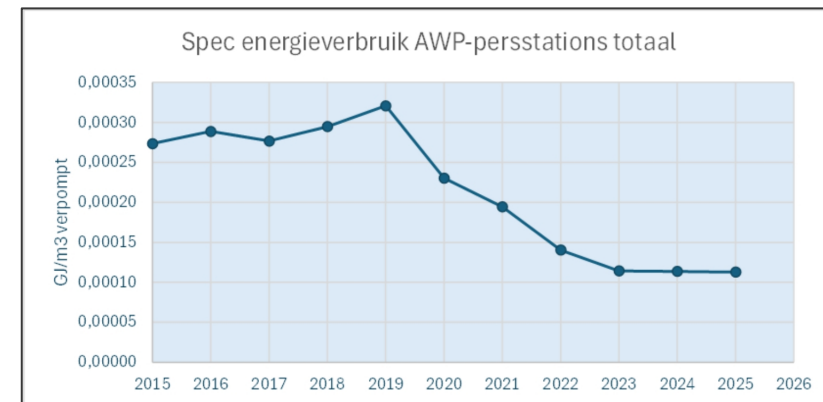

ONTWIKKELING PROGNOSE PROJECTKOSTEN


miljoen euro

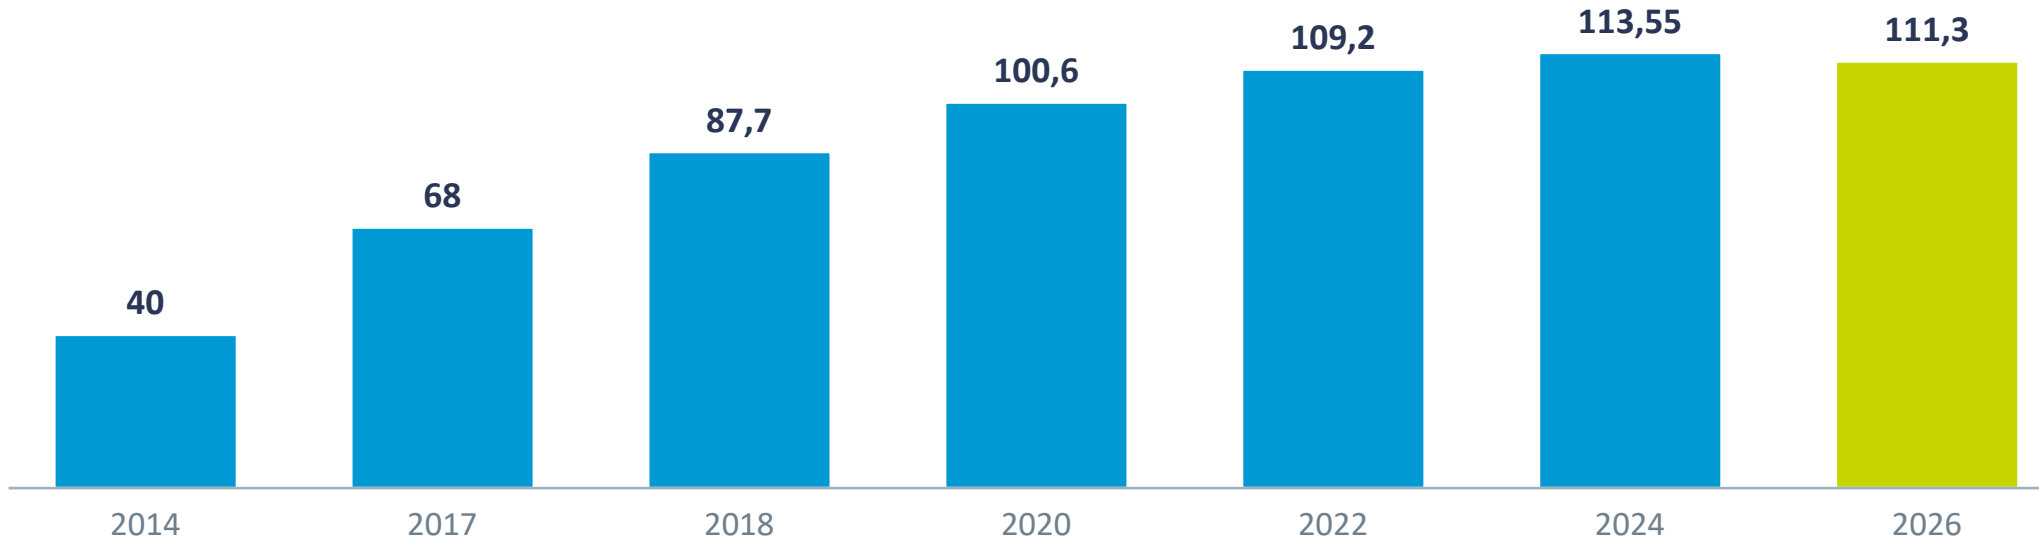

**Afronding: prognose €111,3 mln binnen toegekend krediet €114,55 mln.
Doorlooptijd ruim twee jaar langer dan oorspronkelijk gepland.**



FASERING

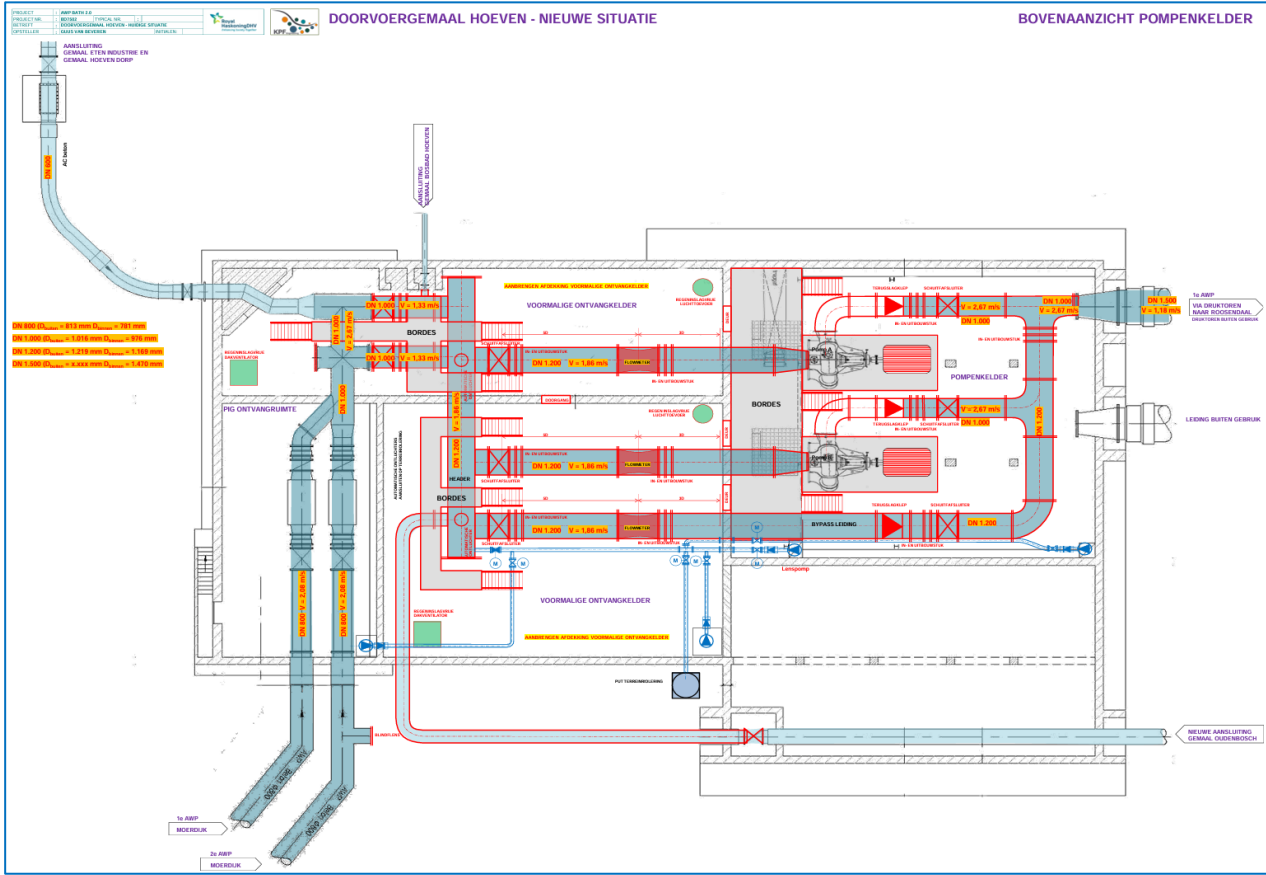

ORGANISATIE



